


TPCabB– Câblage garage de M. DUCASTEL

Système	Centrale photovoltaïque/ garage du pavillon de M. DUCASTEL	Lieu	Durée
Objectif	Montage appareillages électriques en tenant compte des contraintes du local d'implantation	Atelier F01	3,5h
Travail en trinôme			
Nom 1:	Nom 2:		

Données	Système didactisé (garage du pavillon de M. DUCASTEL) <u>Repère système : S3, S8 et S12</u> Boîte à outils Câbles, accessoires de raccordement Coffret électrique PV, appareils de protection Cheminement (tubes)
Evaluation	Réalisation du câblage dans les règles de l'art.

Implantation géographique des Systèmes (atelier F01)

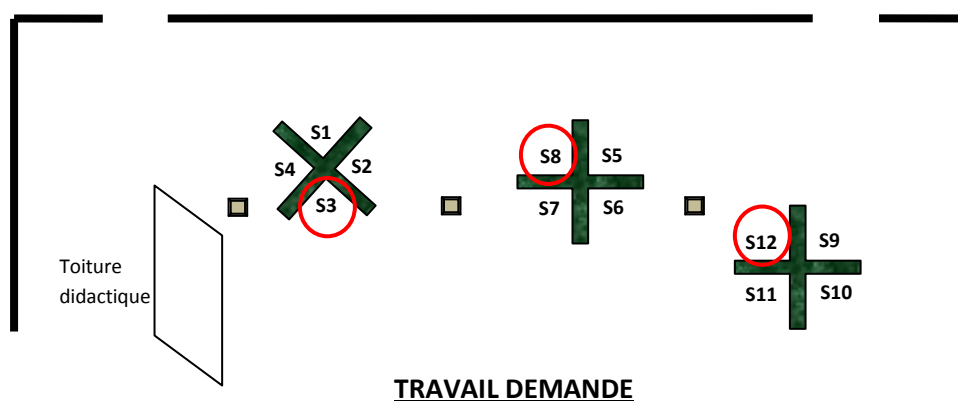

1/ Implantation du matériel

En vous aidant du dossier partiel de réalisation (voir annexes) :

- Traçage de l'implantation du matériel à installer ;
- Pose et fixation dans le coffret les appareils de protection ;

2/ Implantation du cheminement

En vous aidant du dossier de réalisation (partiel) :

- Pose et fixation moulures;


3/ Complétez le schéma de principe (annexe 2) permettant d'avoir l'alimentation d'un éclairage avec un montage de type télérupteur (Q12, BP11, L11) ainsi d'une prise de courant 2P+T (Q13, Pc11).

2/ Raccordement


- Tirage, fixation et raccordement des conducteurs et câbles (voir carnet de câbles à compléter);

TPCabB- Câblage garage de M. DUCASTEL

Annexe 1 : Implantation appareillage électrique (*Systèmes S3, S8 et S12*)

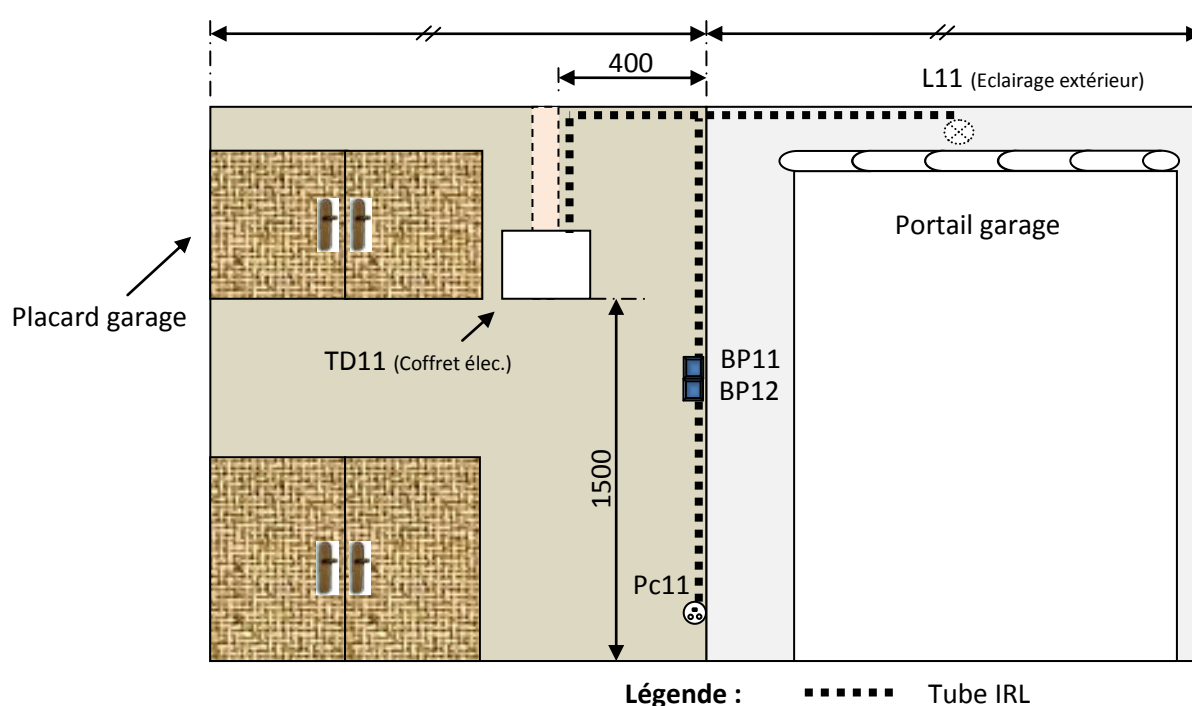

Annexe 2 : Schéma de principe ?

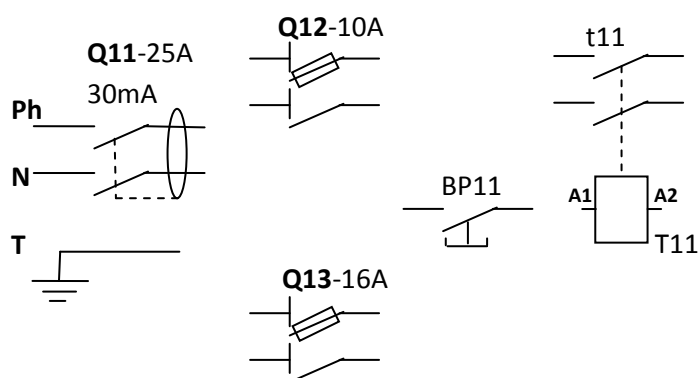

Annexe 3 : Carnet de câbles

Repère	Tenant	Aboutissant	type	longueur	Observation
TD11/Pc11					
		BP11			
	TD1	L11			
